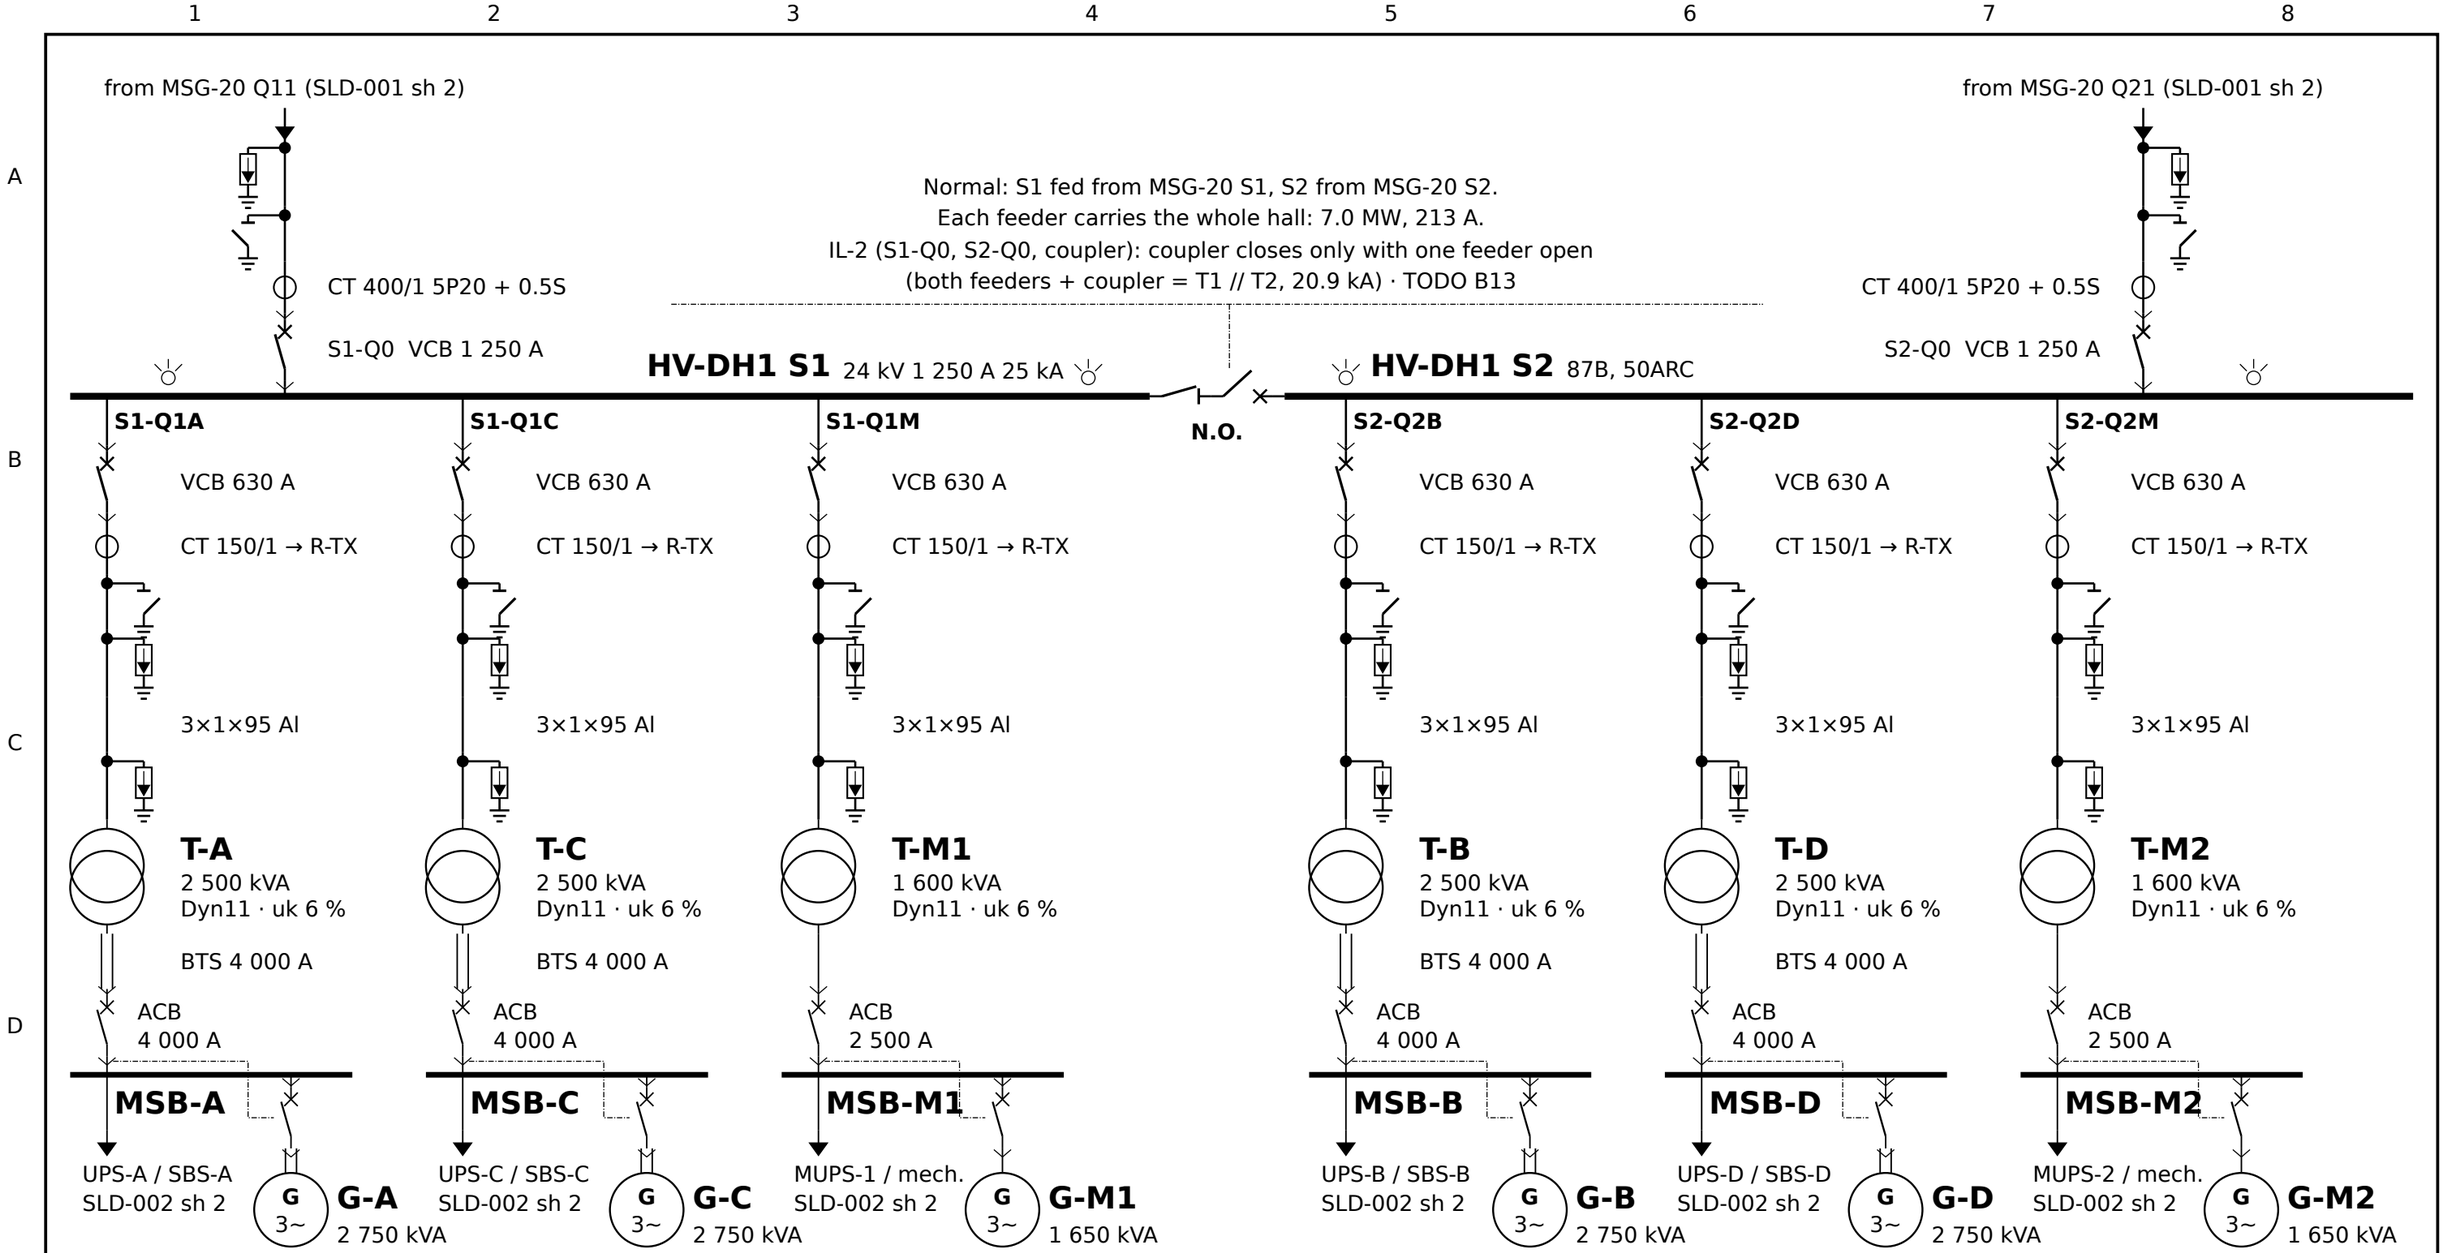


ATS (dash-dot): transformer ACB / genset ACB, open transition only (TODO B14). Gensets via BTS 4 000 A (B5).

| Item | Rating (Rev P2) | Check (CALC-002/3) |
|---|---|---|
| T-A…T-D | 2 500 kVA 20/0.42 kV Dyn11, uk 6 %, Pk 19 kW | N-1 82 % |
| G-A…G-D | 2 750 kVA / 2 200 kWe DCC, Isc ≥ 300 % 2 s | N-1 88 % |
| MSB-A…D | 4 000 A, Icw 65 kA 1 s, Ipk 143 kA | 52.3 kA |
| UPS-A…D | 2 × 1 000 kW, 2 × 165 kWh LFP | N-1 83 % |
| UOSB-A…D | 3 200 A, 65 kA 1 s | 49.3 kA |
| T-M1/M2 | 1 600 kVA kept (1 250 kVA would be 83 %) | 65 % |
| G-M / MUPS | 1 650 kVA; mech. UPS 2 × 250 kW | step ≤ 33 % |

| | | |
|---|---|---|
| **P2** | 2026-10-25 | CALC-002/3/4 ratings, IEC symbols, ≥2.5 mm text |
| **P1** | 2026-10-24 | First concept issue |

**Nordic Hyperscale DC Campus (fictional) · 30 MW IT · SE3**
Portfolio D. Wu · public standards and [ASSUMED] data only

**Data hall DH-1 — sheet 1**
HV-DH1, IT power blocks A–D (4N/3), mechanical 2N
CONCEPT · NOT FOR CONSTRUCTION · scale NTS · A3

| Drawing no. | Sheet | Rev |
|---|---|---|
| **DWU-DC-E-SLD-002** | **1 / 2** | **P2** |
